

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI



Interventi finalizzati al ripristino della rete sentieristica Via Del Sale e Trans Parco Costiero
nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

PROGETTO ESECUTIVO

committente

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
via F. Palumbo, 18 | 84078 | Vallo della Lucania (SA) | t +3909747199200 | f +3909747199217
parco.cilentodianoalburni@pec.it

rup

geol. Aniello Aloia

tecnico incaricato

r.t.p.:
arch. Sergio catalano, arch. Michele Cirillo, arch. Alessandro Bianco, arch. Francesco Vitiello
via A. De Gasperi, tr. U. Foscolo, 3 | 84018 | Scafati (SA)
t +39 0818508666 | m +39 3389943470
s.catalano@awn.it | sergio.catalano@rchitettisalerno.pec

progettista

arch. Sergio Catalano (*capogruppo*)

collaboratori

architetto iunior Noemi Curcio

consulenti

dott. Angelo Acanfora



elaborato

10

Cronoprogramma

formato

A4 verticale

emissione

luglio 2022

controllo

file 10_Cronoprogramma

scala

revisioni

ALLEGATO "A"

Comune di Vallo della Lucania
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi finalizzati al ripristino della rete sentieristica Via Del Sale e Trans Parco Costiero nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

COMMITTENTE: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

CANTIERE: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni via F. Palumbo, 18, Vallo della Lucania (SA)

Vallo della Lucania, 17/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Bianco Alessandro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico Del Procedimento ALOIA Geologo Aniello)

Architetto Bianco Alessandro


Via Anastasio Rossi n°54
80045 Pompei (NA)
Tel.: 3392322336 - Fax: 0818639833
E-Mail: architetto@alessandrobianco.it


CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Impianti di servizio del cantiere Realizzazione di						
impianto elettrico del cantiere Realizzazione di	1	E	3	3		
impianto di messa a terra del cantiere Realizzazione di	1	E	3	3		
impianto idrico del cantiere	1	E	3	3		
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	5	7		
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	3	5		
Viminata viva spondale						
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano	1	E	18	26		
Infissione di paletti in legno	1	E	11	16		
Posa di ramaglia nel solco al piede dell'opera	1	E	10	16		
Messa a dimora di talee e piantine	1	E	10	15		
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano	1	E	5	7		
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	4		
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	16	22		
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	13	19		
Trasporto a recupero di legna e frascome	1	E	11	15		
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	8	12		
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	11	15		
Smobilizzo del cantiere	1	E	15	22		
LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA						
Palificate, palizzate, grate, ecc.						
Costruzione di palizzata in legno	1	E	10	12		
Infissione di paletti in legno lungo il pendio	1	E	7	11		
Intreccio di verghe	1	E	5	7		
Scavi e riprofilature del terreno						
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	E	10	12		
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici	1	E	6	8		
Posa di materiale antierosivo						
Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera	1	E	13	17		
Rinverdimenti						
Idrosemina	1	E	9	12		
Messa a dimora di talee e piantine	1	E	11	15		
Messa a dimora a pettine di talee e piantine	1	E	7	9		
Opere in legno e ferro						
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	6	8		
Posa di ringhiere e parapetti	1	E	7	9		


Verniciatura a pennello di opere in legno	1	E	6	8		
Posa di segnaletica verticale	1	E	22	30		
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p>Entro delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p>Entro delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						

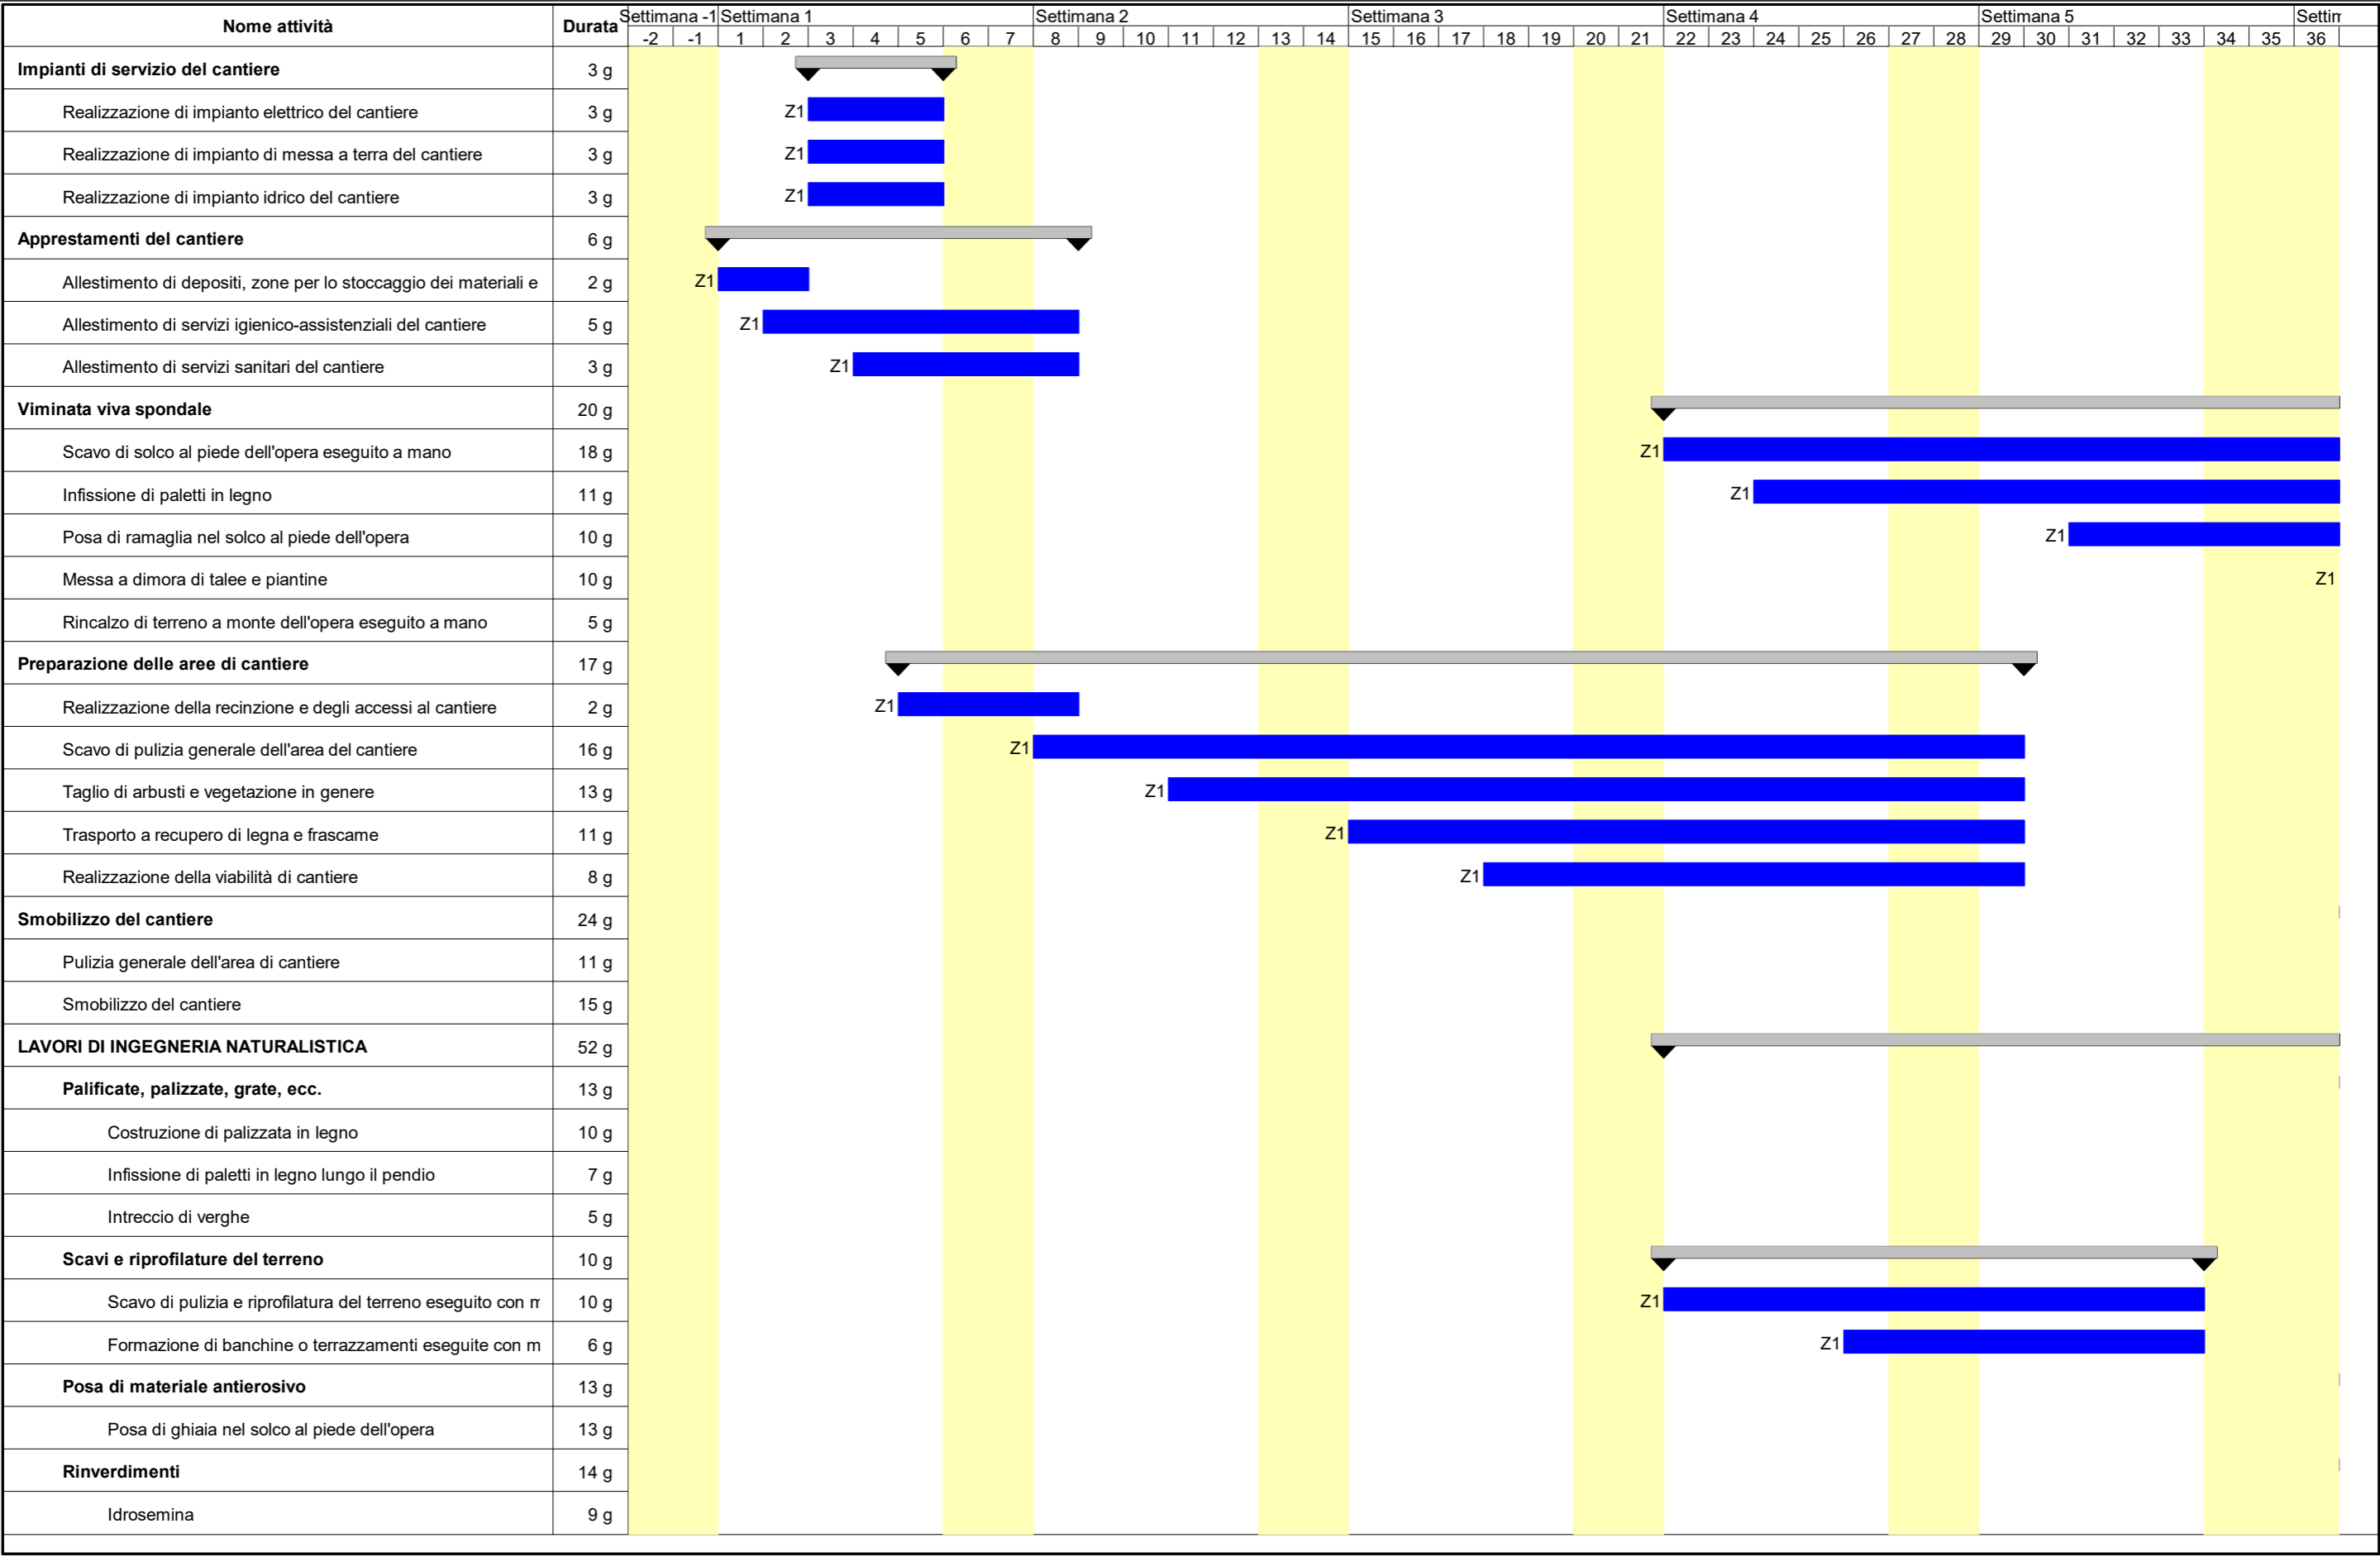

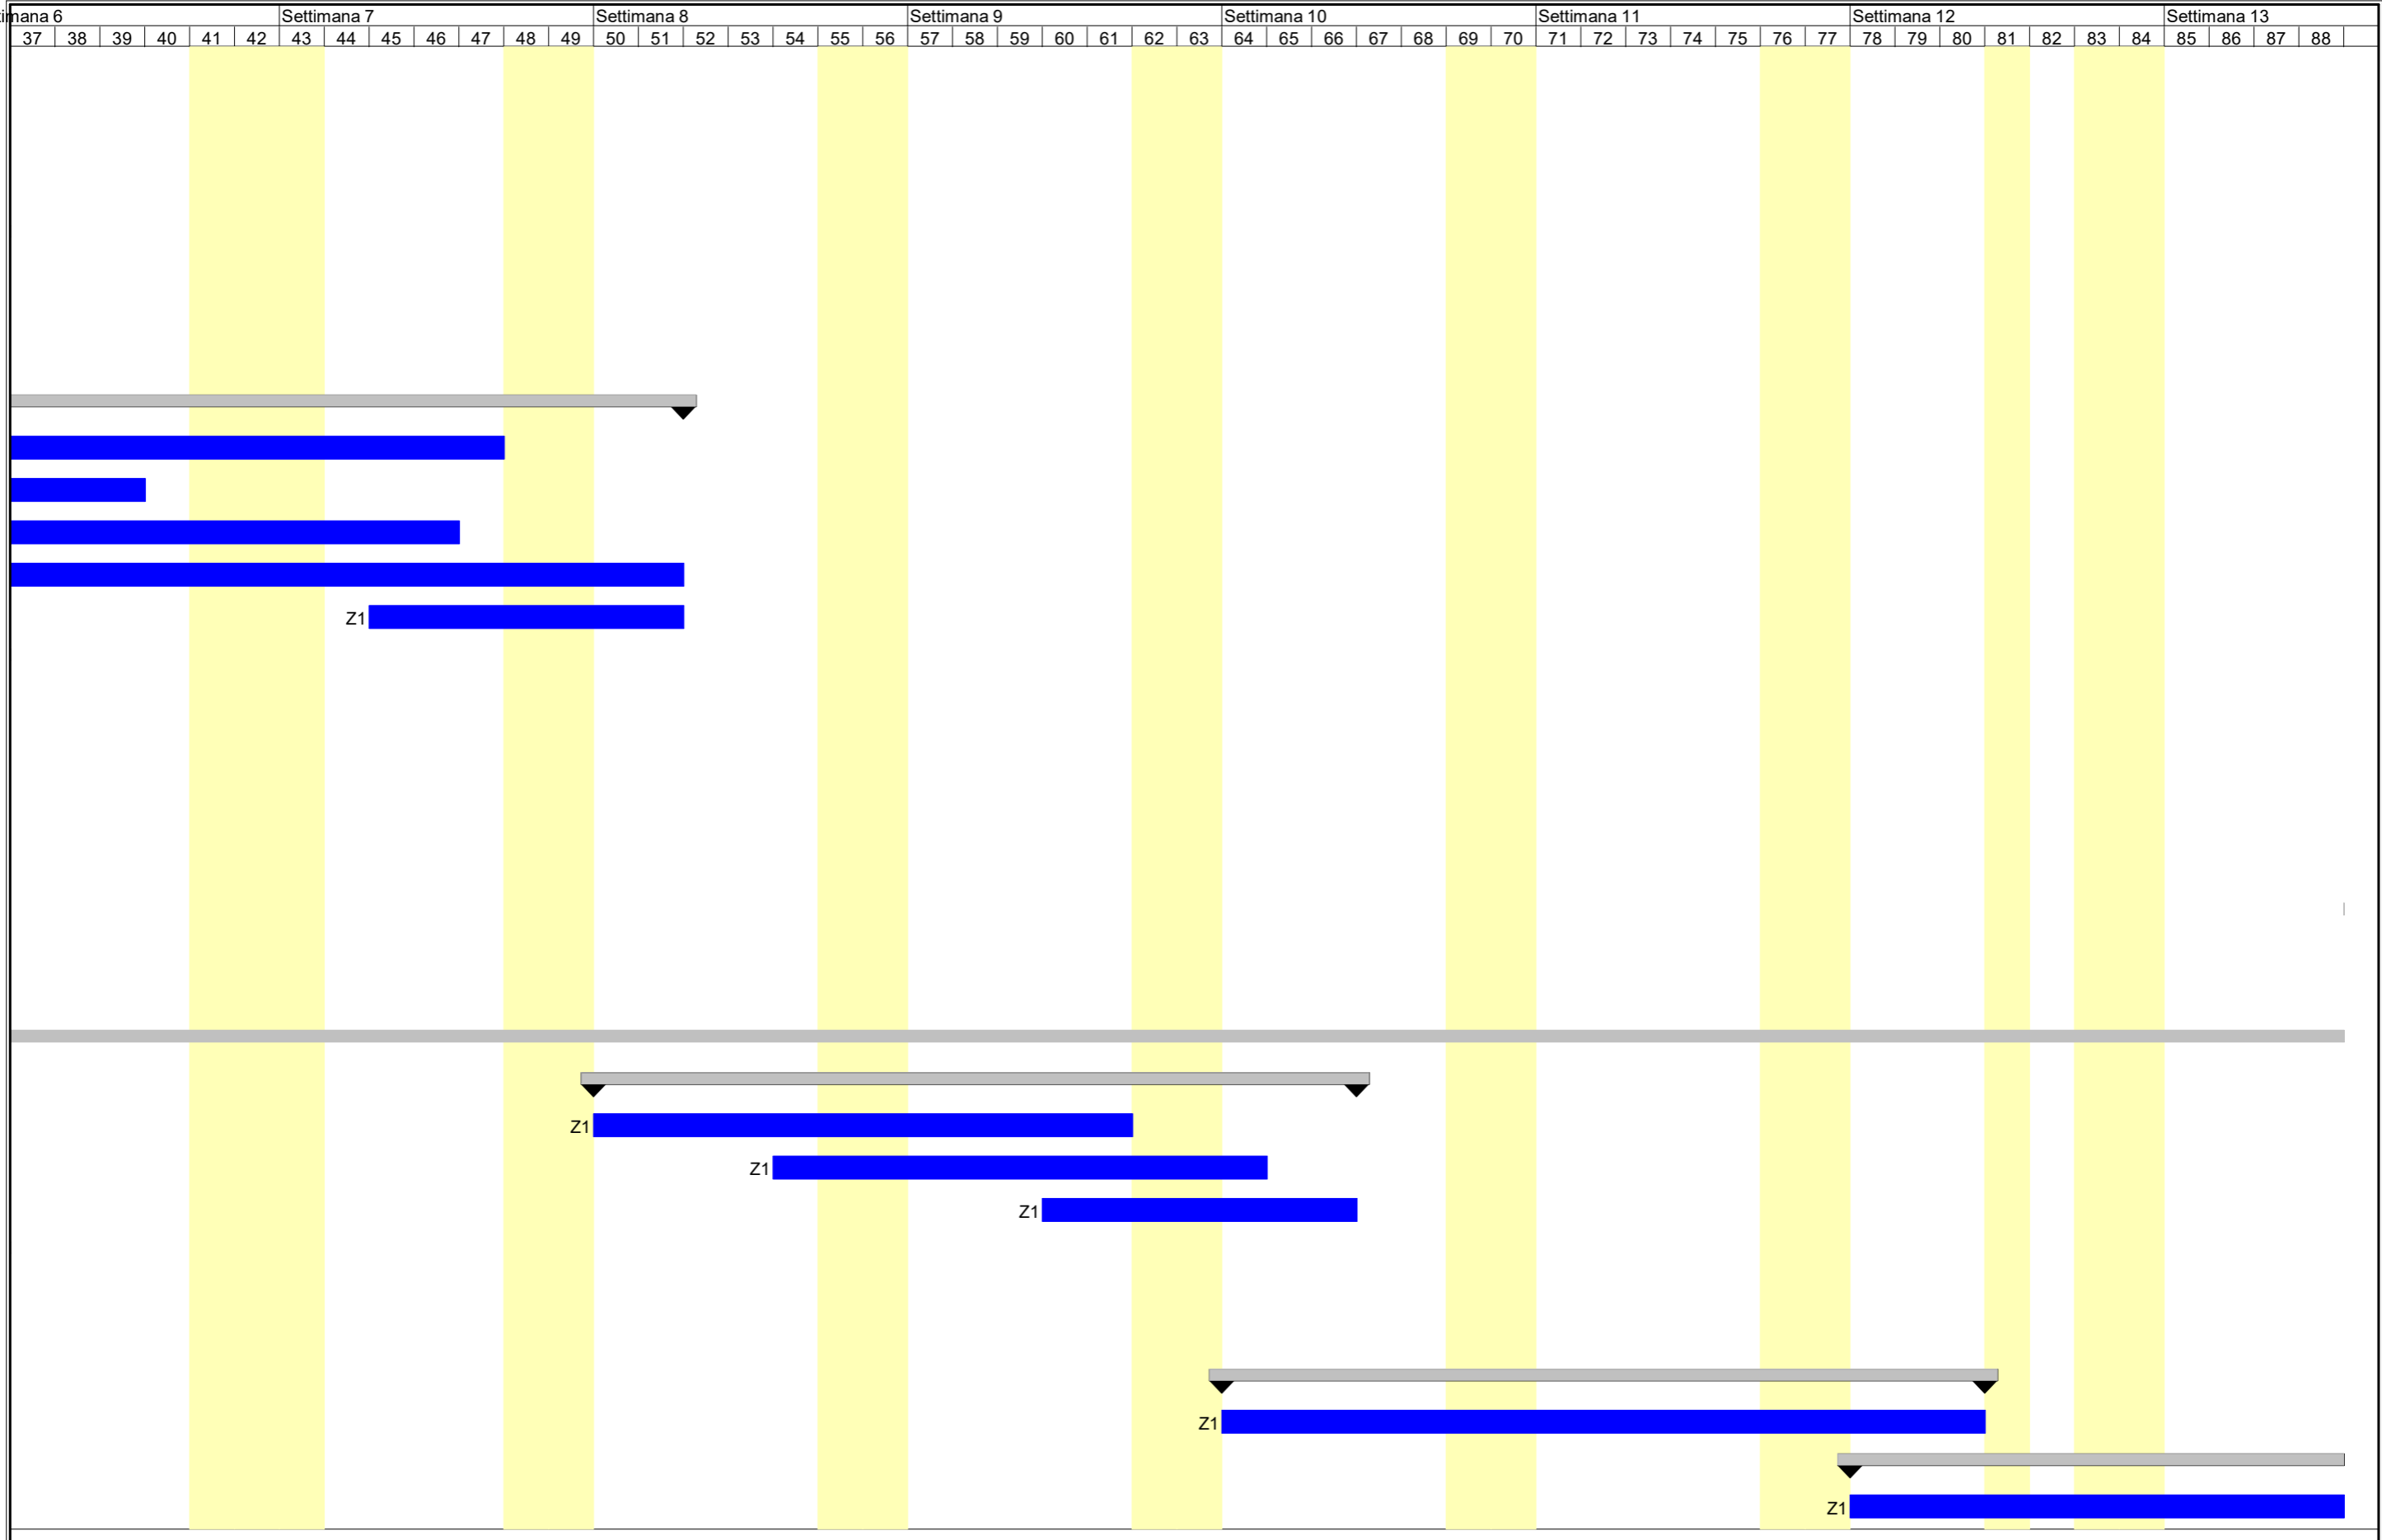

Interventi finalizzati al ripristino della rete sentieristica Via Del Sale e Trans Parco Costiero nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - Pag. 7

			Settimana 14						Settimana 15						Settimana 16						Settimana 17						Settimana 18						Settimana 19						Settimana 20													
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	

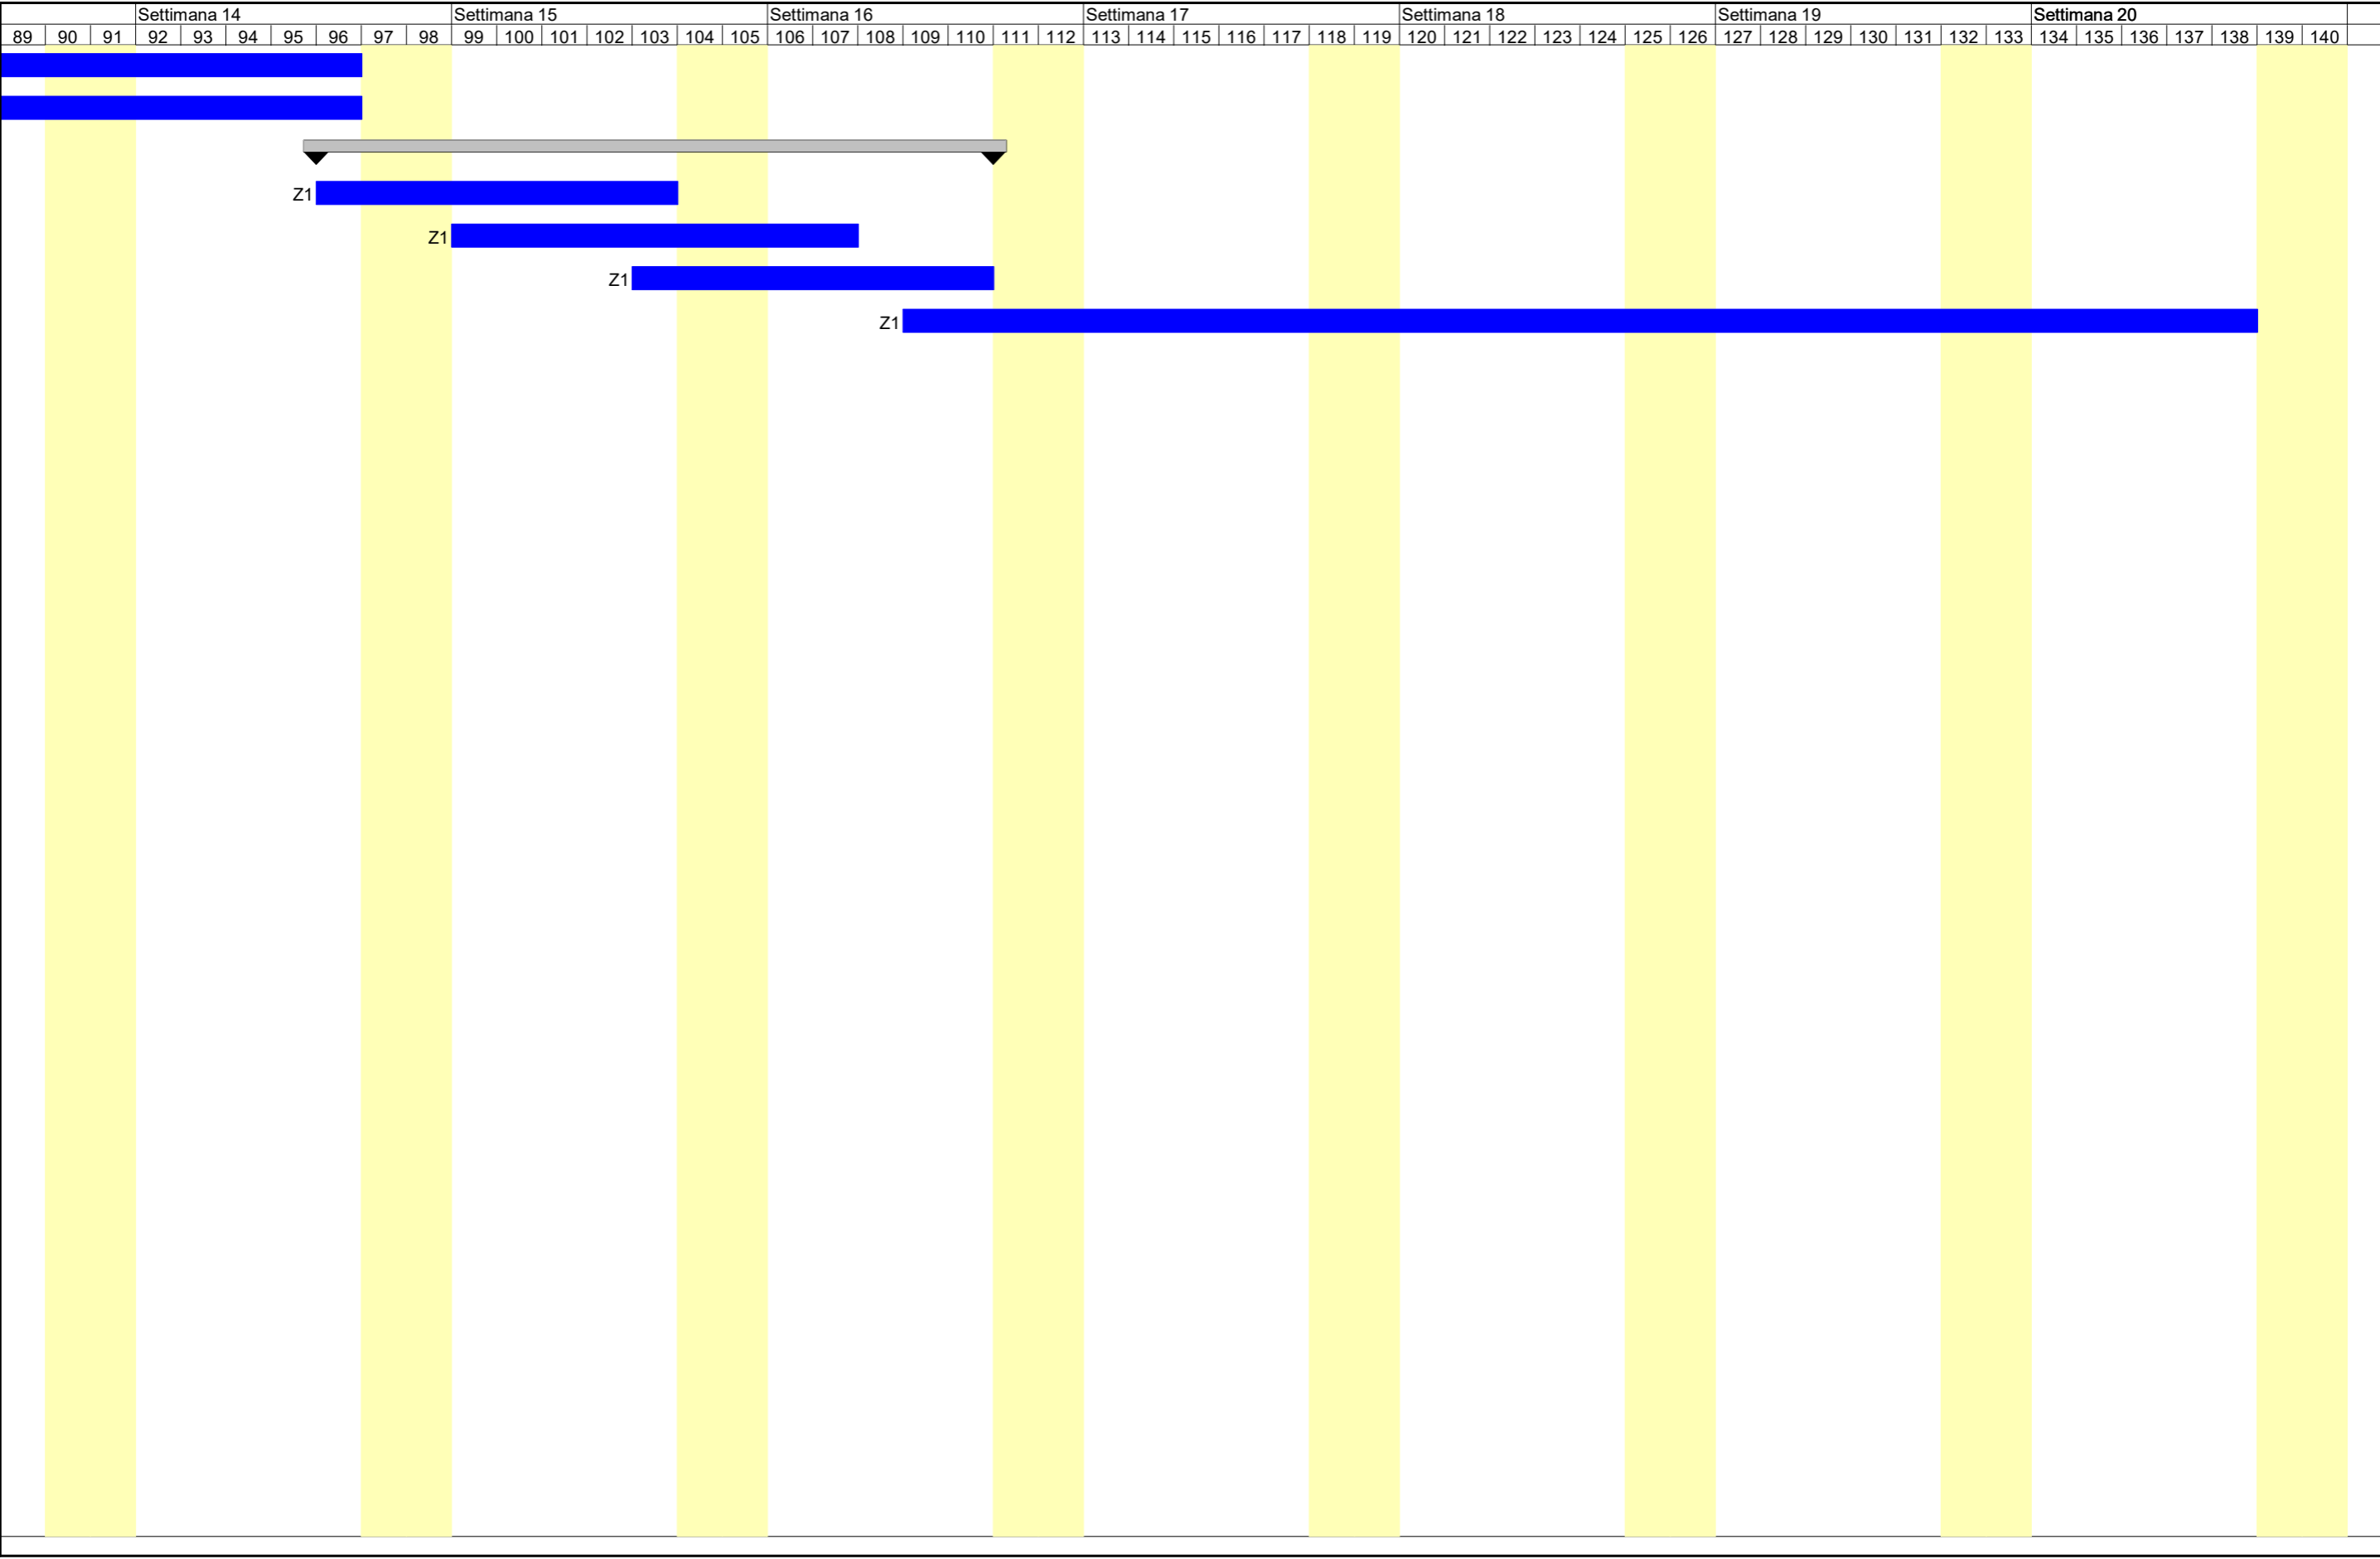

Settimana 21							Settimana 22							Settimana 23						Settimana 24						Settimana 25						Settimana 26						Settimana 27						Settimana 28								
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	
